

東海市立平洲小学校建替えに関する 保護者・地域住民説明会


令和8年4月11日（土） 11時～



東海市教育委員会

説明会次第（本日の説明内容）

1. 施設の概要
2. 現在までの経緯
 - (1) 当初の建替えスケジュール
 - (2) これまでの主な取組み
 - (3) 地質調査の結果
 - (4) 検討委員会の評価と市の方針
 - (5) 移転建替えについて
3. 今後の取組み
4. 質疑回答

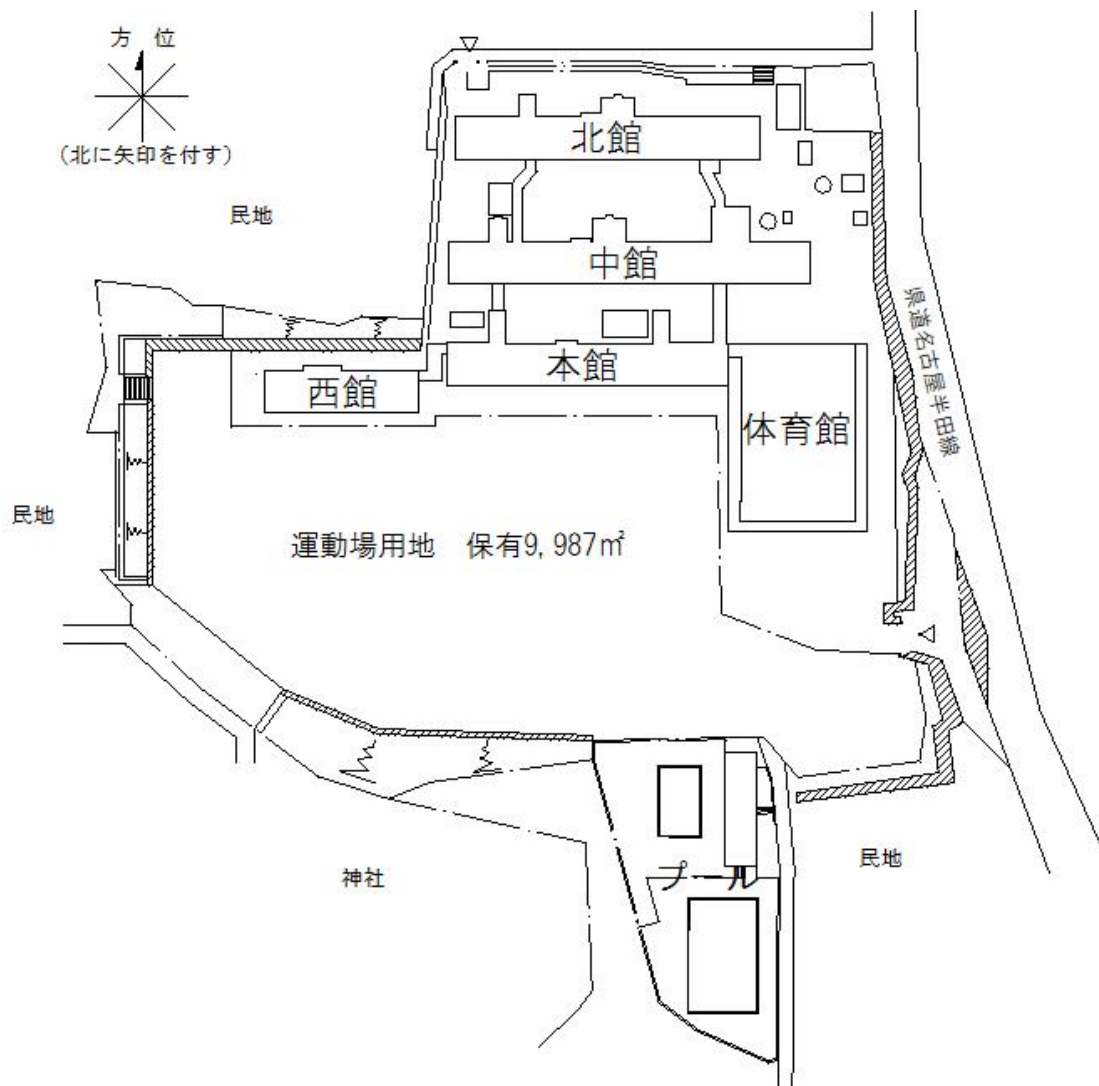

1. 施設の概要

【平洲小学校概要】

※令和8年4月1日現在

児童数：760人

学級数：31学級

【施設の状況】

60年以上経過：1棟（本館）

50年以上経過：3棟（中館、北館、
体育館）

40年以上経過：1棟（西館）



建物が老朽化しており、令和5年
度（2023年度）より建替えの
計画を進めてきました

2. 現在までの経緯

(1) 当初の建替えスケジュール

年度	R 5 (2023)	R 6 (2024)	R 7 (2025)	R 8 (2026)	R 9 (2027)	R 10 (2028)	R 11 (2029)	R 12 (2030)	R 13 (2031)
	基本構想・計画		設計		新校舎建設工事 (現地建替え)			平洲小学校運営 (新校舎)	
	建替え事業における設計や工事を進めていく上での基本的な考え方や指針の策定		建物内の配置・外構計画などを具体化し、工事に必要な設計図面等の作成		新校舎の建設・外構整備			既存平洲小校舎解体工事	

令和12年度(2030年度)の開校を目標に、令和5年度(2023年度)より、平洲小学校の建替えに向けた計画を進めていました

(2) これまでの主な取組み

令和5年9月～

平洲小学校の現況把握のための基礎調査を開始

令和6年7月～
令和7年8月

断層が平洲小学校敷地内に及ぼす影響範囲を確認するため、運動場で地質調査を実施
調査方法・結果について、有識者による考察及び評価を行う検討委員会を設置

令和7年10月

検討委員会を開催

令和8年1月


検討委員会の結果を踏まえ、市としての方針を協議

(3) 地質調査の結果

- ①敷地中央から西側に、南北に走る断層が存在し、断層による影響(ずれ・たわみ)が懸念される

- ②敷地東端に、今回の地質調査では確認されていないが、断層の可能性のある地形的な特徴がみられる

(3) 地質調査の結果

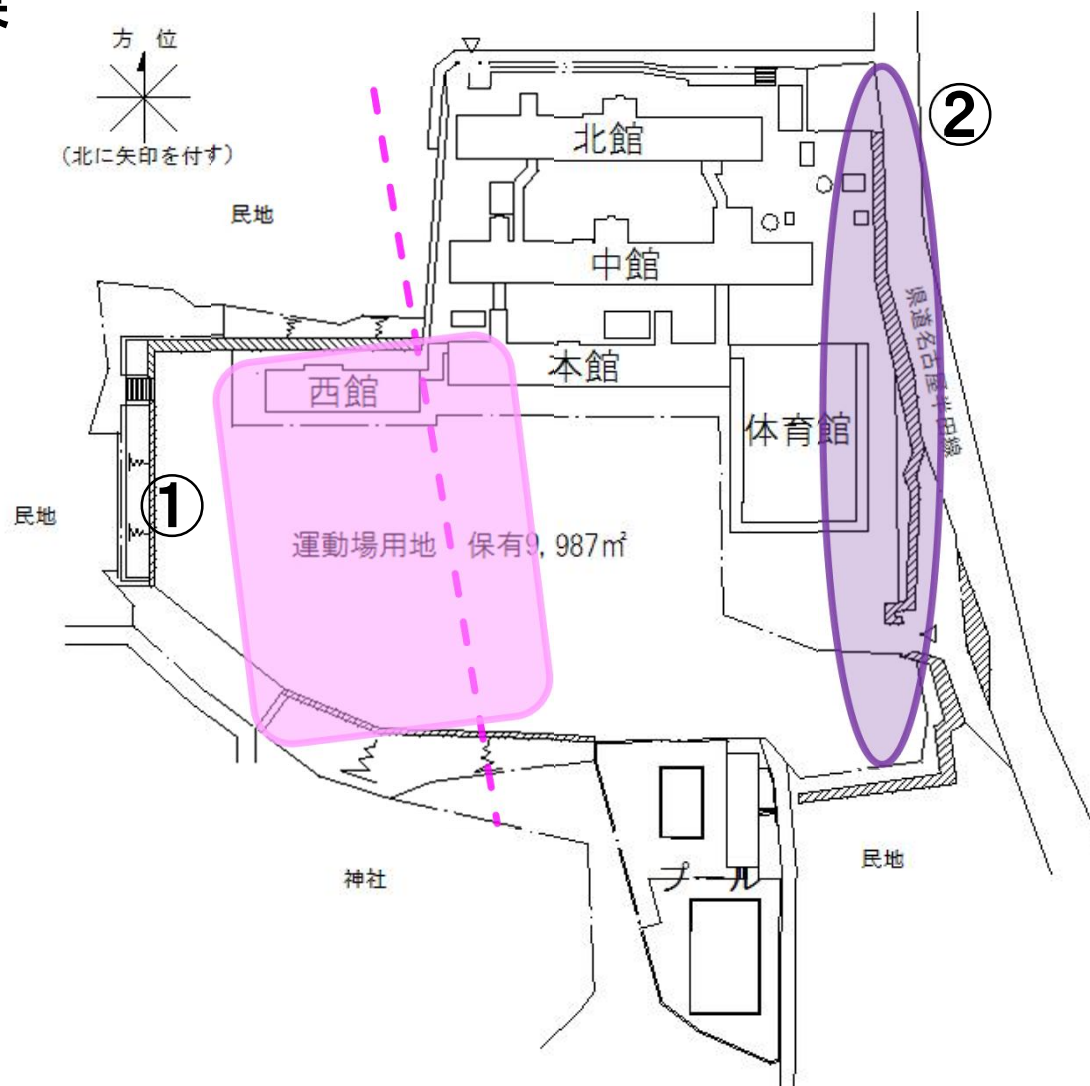

(4) 検討委員会の評価と市の方針

【検討委員会の評価】

- 敷地内に断層が存在すると判断されたこと
- 有識者からは「活断層が分布する地域に設計するのであれば、災害後にどのように利用するか、通常以上に配慮のある設計が必要となる」や「今の建築技術にコストをかければ、地震に対して命を守ることは達成できる可能性はあるが、**災害後に避難所や小学校として使用できるかどうか**については、条件が悪ければ**機能継続は難しい**可能性がある」との意見があったこと。



市の方針

学校は、子どもたちが多くの時間を過ごす施設であり、**安全面を最優先**とすることから現地での建替えを断念する

(5) 移転建替えについて

様々な観点から移転先についての検討を行いました

学習・生活環境


- 校区や通学方法など児童の学習、生活環境に大きな変更、変化が生じないこと

施設

- 新たな教育環境へ対応するため、建物のみでも約10,000㎡の広大な敷地が必要なこと
- 早期に建替えを実現できること

地域等

- コミュニティや近隣住民への影響が比較的少ないこと



移転先は**平洲中学校敷地内**が**最適**と判断しました

3. 今後の取組み（1/2）

令和8年度（2026年度）に施設整備方針を策定します

施設整備方針…目指すべき新しい平洲小学校像を立案し、それに基づいた施設の整備に関する基本的な考え方を定めます

教職員、児童・生徒
保護者、地域住民等

意見聴取



施設整備方針の策定


施設整備方針を策定するため、教職員や児童・生徒だけでなく、保護者や地域住民の皆様からのご意見を伺い整備を進めてまいります

3. 今後の取組み（2/2）

建替えまでのスケジュール(現在の予定)

年度	R 8 (2026)	R 9 (2027)	R 1 0 (2028)	R 1 1 (2029)	R 1 2 (2030)	R 1 3 (2031)	R 1 4 (2032)	R 1 5 (2033)	R 1 6 (2034)	R 1 7 (2035)
	方針策定・計画		設計		新校舎建設工事				平洲小学校運営 (新校舎)	
									既存平洲小校舎 解体工事	

令和16年度(2034年度)の開校を目標に、平洲小学校建替えの検討を進めていきます



ご清聴ありがとうございました

今後とも平洲小学校施設整備にご協力をお願いいたします
